

Projekthandbuch

Einleitung

Alle Projekte, unabhängig von ihrer Größe, haben Gemeinsamkeiten, die Teil dieser "Blaupause" sind.

Zu den Gemeinsamkeiten von Projekten gehören neben quantitativen Messgrößen wie z. B.

- Soll-Ist-Vergleich verbrauchter Stunden
- Soll-Ist-Vergleich externer Kosten
- Einhaltung des Zieltermins

auch die Projektphasen

- Initiierung (Projektidee)
- Planung (Projektvorlage)
- Durchführung
- ggf. Change Request
- Abschluss

i Weitere Gemeinsamkeiten von Projekten sind

- die zur Umsetzung erforderlichen projektbeteiligten Rollen (Projektleitung, IT-Koordination, etc.),
- die zur Umsetzung erforderlichen Einzelaufgaben in den jeweiligen Projektphasen (Zielsetzung, Aufwandsschätzung, etc.) und
- die zielgerichtete Kommunikation innerhalb des Projektteams und darüber hinaus.


? Diese Blaupause dient der Unterstützung aller Projektbeteiligten und gibt Antworten / Hilfestellungen zu den Fragestellungen:

- Welche Tätigkeiten fallen an?
- Welche Rollen werden für das Projekt benötigt?
- Wer, innerhalb des Projektteams, übernimmt welche Rolle / Rollen?
 - Achtung: Die verschiedenen Rollen können durchaus von denselben Personen wahrgenommen werden!
- Wie erfolgt die Kommunikation nach innen und außen des Projektes?
- Wie erfolgt das Anforderungsmanagement?
- Kurzum:
 - Was ist zu tun?
 - Wann?
 - Von wem?
 - Wer setzt um?
 - Wer ist verantwortlich?
 - Wer ist zu informieren?
 - Wer kann beratend unterstützen?

i Die vorliegende Blaupause ist als Kopiervorlage für ein neues Projekt gedacht und kann an die eigenen Projektbedürfnisse angepasst werden.

⚠ Die Fülle an unterschiedlichen Themen, die aus den Fragestellungen resultieren, sind als Ergebnis in einer Projekt-Matrix zusammengefasst und detailliert beschrieben.

Einheitliches Tool-Set (Confluence, Jira, PPM Pro)

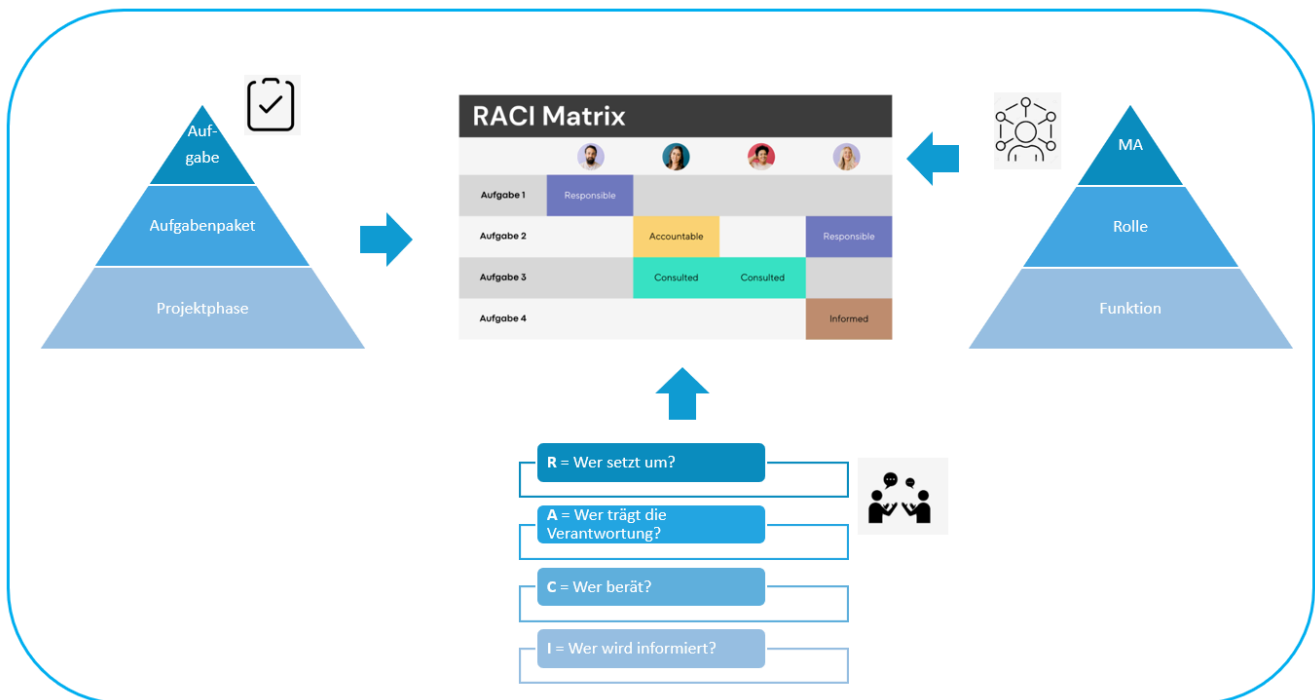

Projekt-Matrix

Die Projekt-Matrix ist angelehnt an das RACI-Diagramm.

Ein RACI-Diagramm oder eine Verantwortungszuweisungsmatrix ist ein Projektmanagement-Tool, das Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb eines Projektteams definiert und klarstellt. RACI-Diagramme unterteilen diese Rollen in vier Komponenten: Verantwortlich, Umsetzung, Konsultiert und Informiert. Eine klare Kommunikation hilft, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Rechenschaftspflicht für Aufgaben oder Ergebnisse sicherzustellen.

R(esponsible) – Wer setzt um?	
Bedeutung	Die Person oder das Team, das direkt für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich ist. Sie erledigen die praktischen Arbeiten, z. B. das Erstellen eines Berichts, die Durchführung einer Analyse oder die Entwicklung eines Prototyps.
Verantwortung	• Sicherstellen, dass die Aufgabe abgeschlossen wird. • Aktive Durchführung aller Schritte, die für die Erfüllung der Aufgabe notwendig sind. • Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten, die konsultiert (C) oder informiert (I) werden müssen.
Beispiel	Ein Java-Entwickler (R) schreibt den Code für ein neues Feature oder erstellt die technische Umsetzung eines

	Anwendungsfalls.
A(ccountable) – Wer trägt die Verantwortung?	
Bedeutung	Die Person, die die letzte Verantwortung trägt und dafür sorgt, dass die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wird. Diese Person gibt die endgültige Freigabe, trifft strategische Entscheidungen und steht letztendlich für den Erfolg (oder Misserfolg) der Aufgabe ein.
Verantwortung	• Überprüfung und Freigabe der Ergebnisse. • Delegieren von Aufgaben an die Zuständigen (R). • Sicherstellen, dass die Aufgabe im geplanten Rahmen (Zeit, Budget, Qualität) abgeschlossen wird.
Wichtigster Unterschied zu R	Die Accountable-Person (A) hat die letzte Entscheidungsbefugnis , delegiert die operative Arbeit jedoch an die Responsible-Person (R). Sie ist nicht unbedingt in die praktischen Details eingebunden, muss aber jederzeit den Überblick behalten und korrigierend eingreifen können.
Beispiel	Ein Gruppenleiter oder Projektmanager (A) überprüft und gibt die technische Umsetzung frei. Sie trägt die Verantwortung gegenüber dem Management, dass die Aufgabe den Anforderungen entspricht.
C(onsulted) – Wer berät?	
Bedeutung	Personen, die Fachwissen oder spezifische Expertise einbringen. Sie werden während der Arbeit konsultiert und können wichtige Inputs oder Empfehlungen geben.
Verantwortung	• Unterstützen die Zuständigen (R) mit Fachwissen oder Feedback. • Werden aktiv eingebunden, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Beispiel	Ein Aktuar oder Data Scientist (C), der mathematische Modelle oder Datenanalysen bereitstellt, um eine Aufgabe zu unterstützen.
I(nformed) – Wer wird informiert?	
Bedeutung	Personen oder Gruppen, die über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert werden müssen. Sie sind passiv involviert und haben keinen direkten Einfluss auf die Durchführung.

Verantwortung	• Erhalten regelmäßige Updates, damit sie auf dem Laufenden bleiben. • Müssen nicht aktiv in die Arbeit eingebunden werden.
Beispiel	Ein Stakeholder aus einer anderen Abteilung (I), der über den Fortschritt eines Pilotprojekts informiert wird.

Zusammenfassung des Unterschieds zwischen A und R

	A	R
Hauptaufgabe	Letzte Verantwortung, Freigabe	Durchführung der operativen Arbeit
Einflussbereich	Strategisch, Überblick behalten	Operativ, Detailarbeit
Entscheidungsbefugnis	Trifft finale Entscheidungen	Führt aus, was entschieden wurde
Fokus	Zielerreichung sicherstellen	Praktische Umsetzung

Beispiel für A und R in einem Projekt

- **Aufgabe:** Entwicklung eines KI-gestützten Tools.
- **A (Accountable):** Der Gruppenleiter überprüft, ob das Tool den Anforderungen entspricht und gibt es frei.
- **R (Responsible):** Die Entwickler implementieren das Tool, führen Tests durch und bereiten es zur Übergabe vor.

Blaupause | Projekt-Matrix

Rollen innerhalb eines Projektes

- Erläuterung Rollenbeschreibung
- Projektleitung
- Fachbereichs-Koordinator
- Anforderungsmanager
- Fachexperten
- Business Analyst
- Führungskraft Fachabteilung
- IT-AE Koordinator
- Test-Koordinator (entfallen und unter Testmanager zusammengefasst)
- IT-AE Architekt
- IT-AE Anwendungsentwickler
- IT-AE Führungskraft
- Testmanager
- Fehlermanager
- Testdatenmanager
- Tester Fachabteilung
- Tester IT-Betrieb
- IT-AE Testautomatisierer
- Multi-Projekt-Management (MPM)
- Sonderfunktion
- F1er
- Vorstand

- Priorunde
- Lenkungsausschuss (LA)
- IT-Betrieb Koordinator
- IT-Betrieb Führungskraft
- IT-Betrieb Administrator
- IT-Betrieb Produktion
- IT-Betrieb Client Service
- IT-Betrieb Change Manager
- Externe Mitarbeiter

Projektaufgaben

- Erläuterung Projektaufgabensteckbrief
- (Erste) Idee / Impuls
- Steckbrief
- Grobe Bewertung
- Projektaufwand & -Team bekannt (Fast Lane)
- Formulierung der Problembeschreibung & Zielstellung
- Zuweisung IT-AE und IT-Betrieb Koordination
- Bestimmung der Projektgröße
- Aufwandsschätzung - Planungsphase
- Grobe Terminierung
- Make or Buy
- Auswahl Sonderfunktionen
- Genehmigung Projektidee
- Projekt-Organisation einrichten
- Projektstrukturplan erstellen
- Kommunikationsplan einrichten
- Anforderungen priorisieren
- Technisches Konzept erstellen
- Testplanung
- Projekteintrag Sonderfunktionen
- Aufwandsschätzung Fachabteilungen
- Aufwandsschätzung IT-AE
- Aufwandsschätzung Testmanagement
- Aufwandsschätzung IT-Betrieb
- Personalausstattung Fachabteilung vornehmen
- Personalausstattung IT-AE vornehmen
- Personalausstattung Testmanagement vornehmen
- Personalausstattung IT-Betrieb vornehmen
- Terminplan erstellen
- Genehmigung Projektvorlage
- Anforderungen detaillieren
- Anforderung umsetzen
- Kontinuierliche Überwachung des Projektfortschritts
- Über Projektfortschritt informieren (Statusbericht)
- Projektfortschritt steuern
- Teststeuerung und -überwachung
- Testdurchführung (Analyse, Entwurf, Realisierung, Ausführung)
- Situative Eskalation
- Risikoüberwachung
- Retrospektive / Lessons Learned

- Testmanagement Freigabeempfehlung
- Freigabe
- Übergabe / Produktion
- Abschluss einreichen & Genehmigung
- Projektorganisation auflösen

Anforderungsmanagement

Kommunikationsplan
